



  
**ZUBA**  
**Z18**  
OCTUBRE 2025

OCTUBRE 2025

**ZUBA**  
**18**



**TRABAJOS REALIZADOS**



**AVANCE DE OBRA**




## TRABAJOS REALIZADOS

### ❖ Avance de obra:

- Mampostería en Azotea
- Carpetas en áreas Húmedas
- Revoque Interior
- Revoque Exterior
- Carpeta RDC
- Cableado Nivel 7 (80 %) y Montaje de tablero Nivel 1 (95 %)
- Colocación de bandeja (100 %)
- Colocación de CONDUIT Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8(100 %)
- Instalación de Termo calefones
- Colocación de cielorraso



## TRABAJOS REALIZADOS


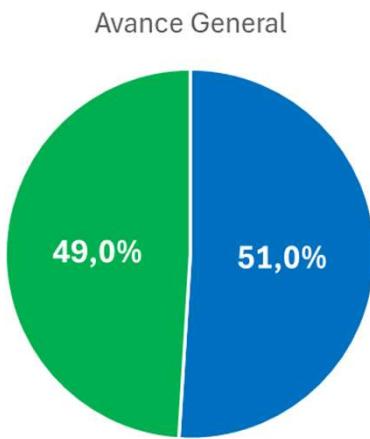


- Avance de obra actual
- Avance restante

- Replanteo de mampostería de Azotea lleva con un avance del 100 % y actualmente con un 90 % con respecto a mampostería de elevación de ladrillo Hueco de 12 y 18.
- Durante este mes se inicio el revoque interior del Nivel 4 y 5, Con un avance del 90%. Con respecto al Nivel 6 , se dispone de un 30% de avance. En el Nivel 3 se lleva un avance del 80 % de mocheta.
- Durante este mes se inicio la etapa de Revoque Exterior, en los tienen un avance del 40% con balancín y sin balancín 20%.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de carpeta RCD tienen un avancen del 100% en el Nivel 3 y Nivel 4, y Nivel 5.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de carpeta en las zonas húmedas tienen un avance del 80% en el Nivel 1 hasta el Nivel 7 y Azotea un 20%.
- Durante este mes se inicio la etapa de Cableado del Nivel 1 al 7 que llevan un avance del 80% , también ya inicio la colocación de Tableros que actualmente están en un 95% en el Nivel 1.
- Durante este mes se continuo la etapa de conduit del Nivel 1 al 8 que llevan un avance del 100%.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de termo calefones del Nivel 1 – 2 y llevo un avance del 100%.
- Durante este mes se inicio la etapa de colocación de Cielorraso del Nivel 1 ,2 , 3 y llevo un avance del 70%.



## AVANCE DE OBRA

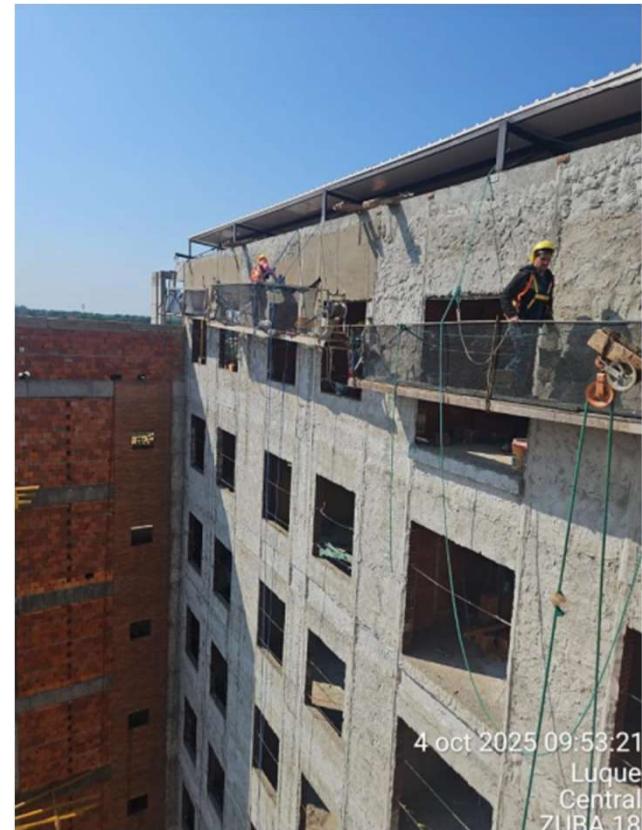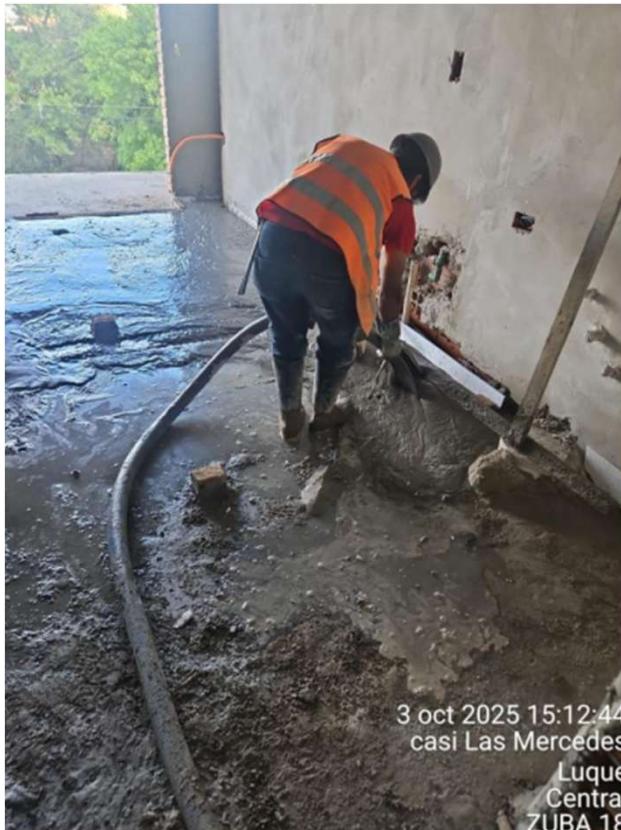


Revoque exterior y Cargamento de contrapiso

ZUBA 18 ZUBA



## AVANCE DE OBRA

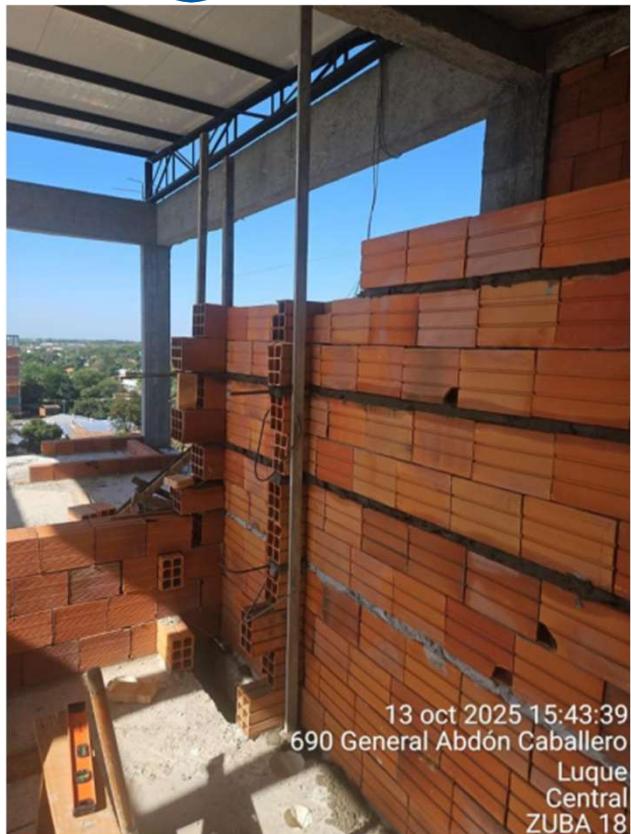

Elevación de mampostería y Revoque interior

ZUBA 18 ZUBA



## AVANCE DE OBRA



Revoque Exterior – Instalación de Cielorraso

ZUBA 18 ZUBA



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

