



ZUBA
PLAZA
TH1
SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

PLAZA

TH1



Definiciones



Descripciones de los trabajos



Anexos Fotográficos



Definiciones

TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/09/2026 se evidencia lo siguiente:

- Cargamento de losa N13
- Cargamento de pilares N13-N14
- Cargamento de losa N14
- Avance en armadura de pilares N14-AZ
- Cargamento de escalera tramo N10-N11
- Cargamento de escalera tramo N11-N12
- Cargamento de escalera tramo N12-N13
- Avance de revoque en caja de escalera hasta el Nivel 7
- Avance de revoque en unidades hasta Nivel 9
- Avance de mampostería hasta Nivel 10
- Avance en replanteo de mampostería en el Nivel 11
- Avance en instalación de PCI hasta el Nivel 9
- Avance de instalaciones de Agua Corriente hasta el Nivel 9
- Avance de instalaciones de Desagüe Cloacal hasta el Nivel 8
- Avance de instalaciones de ducteado eléctrico hasta el Nivel 9
- Avance en colocación de caja de tablero seccional
- Colocación de insertos para barandas, hasta el Nivel 7



Definiciones



TEMAS A INFORMAR

Hasta la fecha 30/09/2026 se evidencia lo siguiente:


- Avance en carpeta de protección para imprimación, en balcones de Monoambientes y tipología de 1 Dormitorios, desde el Nivel 2 al Nivel 7
- Avance en aislación de baños, hasta el Nivel 5
- Avance en en baños de: carpeta base para pisos, hasta el Nivel 5; revoque hidrífugo hasta el Nivel 9
- Avance en la colocación de premarcos para aberturas, hasta el Nivel 6
- Avance en el revoque de las fachadas, hasta el Nivel 9.
- Inicio de la colocación de pisos en los departamentos de la tipología de 1 Dormitorio.
- Presentación de mampara para la tipología Monoambiente, en el Nivel 2
- Avance en mampostería de la Planta baja
- Avance en revoques de la Planta Baja
- Avance en mampostería del Entrepiso



Avance General de Obra

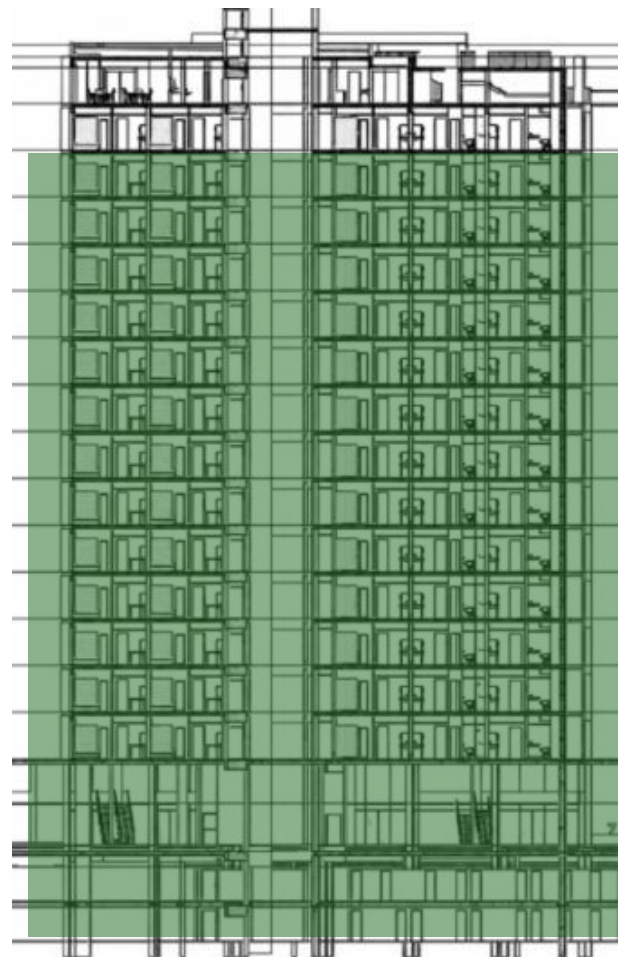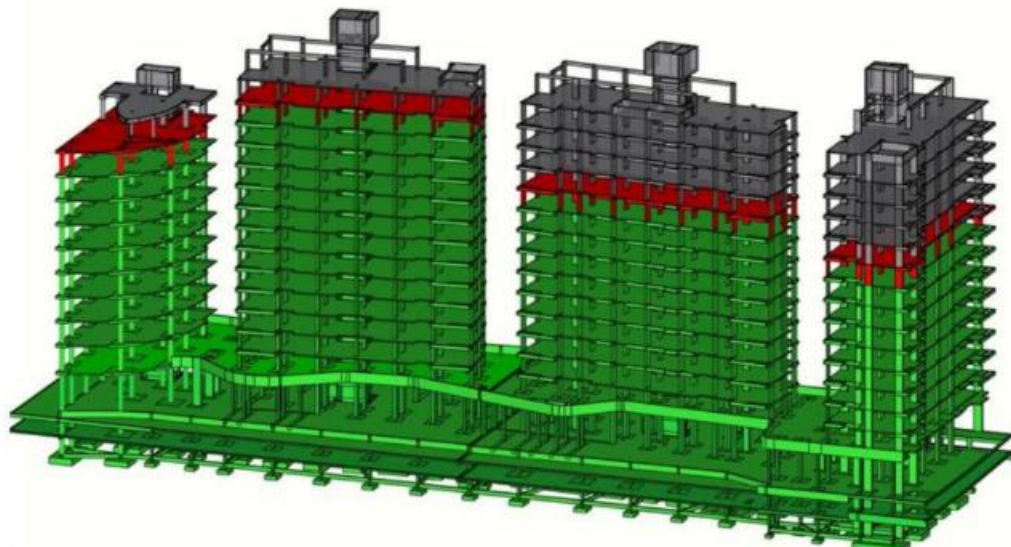

Avance General

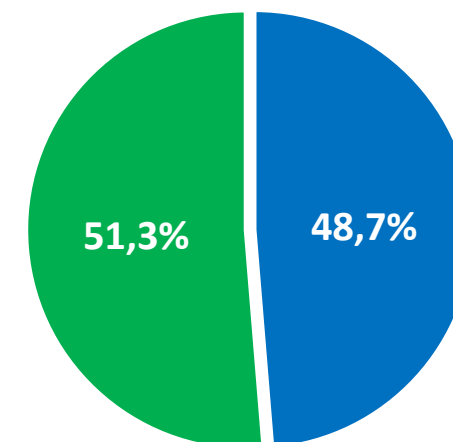

■ Avance de obra actual

■ Avance restante



Anexos Fotográficos



Cargamento losa N13



Anexos Fotográficos



Armadura y encofrado de losa N14 – Cargamento de escalera tramo N12-N13



Anexos Fotográficos



Cargamento Losa N14



Anexos Fotográficos



Prueba de estanqueidad en baño – Revoque de escaleras – Prueba de presión de Agua Corriente



Anexos Fotográficos



Replanteo de mampostería – Colocación de insertos para barandas – Carpeta base para imprimación



Anexos Fotográficos



Revoque de fachadas




Anexos Fotográficos



Colocación de premarcos de aberturas – Colocación/prueba de Tablero Seccional



Anexos Fotográficos

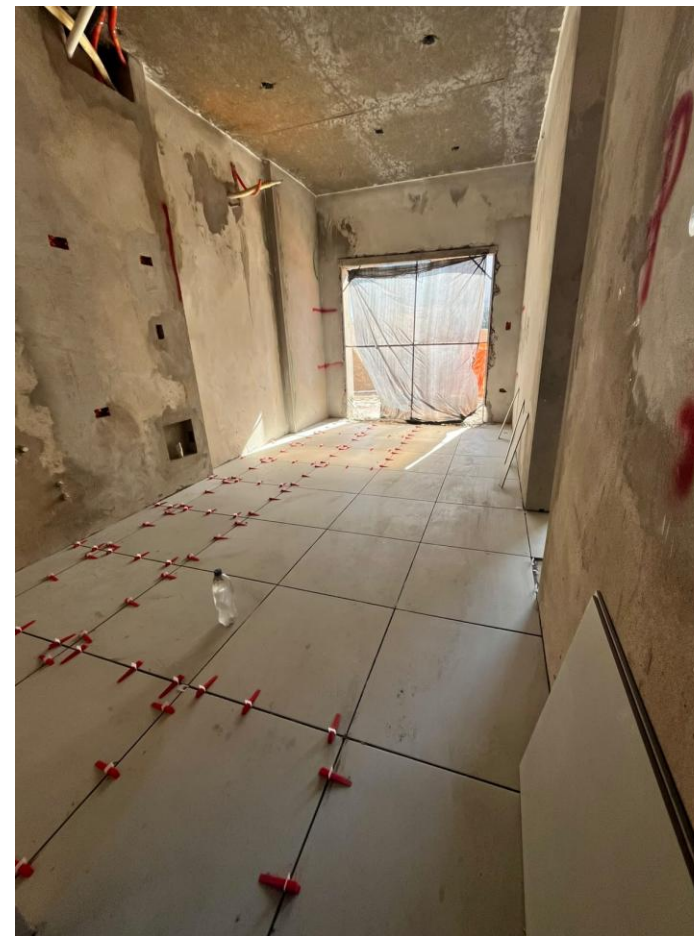

Colocación de pisos



Anexos Fotográficos



Avance de mampostería en Planta Baja y Entrepiso



**¡MUCHAS
GRACIAS!**
