



# ZUBA 18

JUNIO 2026

JUNIO 2026

# ZUBA

# 18




**TRABAJOS REALIZADOS**



**AVANCE DE OBRA**



# TRABAJOS REALIZADOS

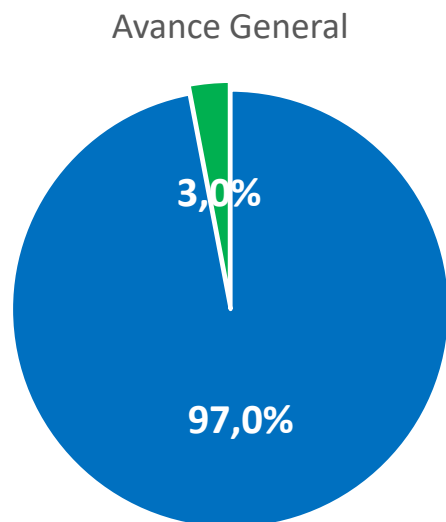


■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- TRABAJOS REALIZADOS:
- AZOTEA:
- Pintura interior de palieres
- Pintura interior de baños, deposito, laundry
- Colocacion de aberturas de vidrio en los quinchos
- Texturado de paredes
- Colocacion de pisos en piscina
- PALIERES:
- Terminaciones de pintura de paredes y cielorraso
- PLANTA BAJA:
- Colocacion de pisos exterior
- Colocacion de pisos en vereda
- Colocacion de porton vehicular
- Trabajos de texturado en muros linderos
- ESTACIONAMIENTOS:
- Terminacion de piso tipo pavers
- Cementicio en losas
- Pintura de caños de PCI



# AVANCE DE OBRA

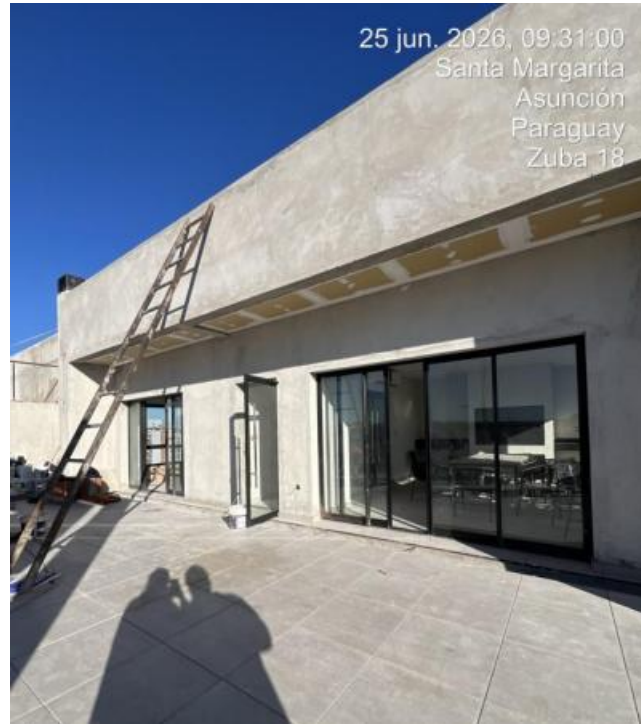

Vistas en Azotea Exterior




# AVANCE DE OBRA



Terminaciones en Quinchos



# AVANCE DE OBRA

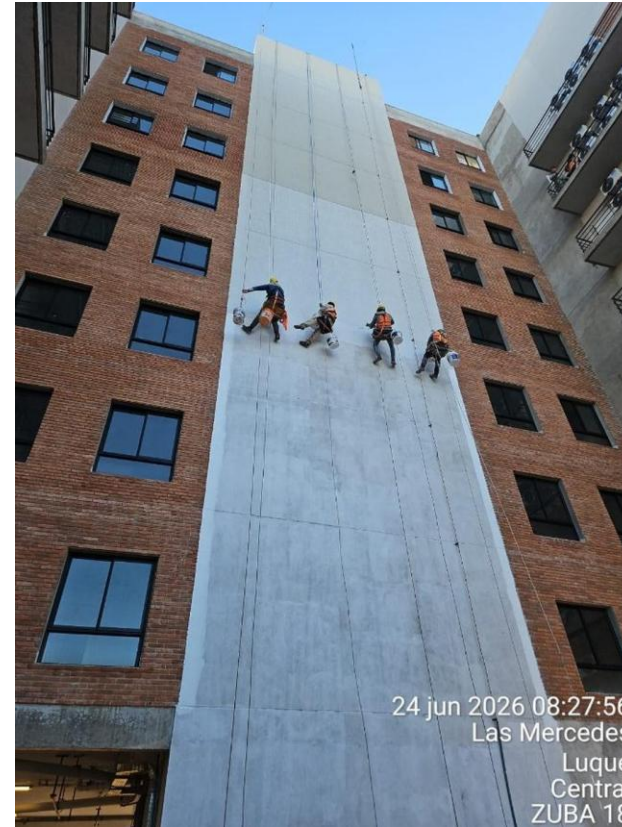

Texturado en Fachadas




## AVANCE DE OBRA



Colocación de pisos en piscina – Texturado en fachada principal



# AVANCE DE OBRA

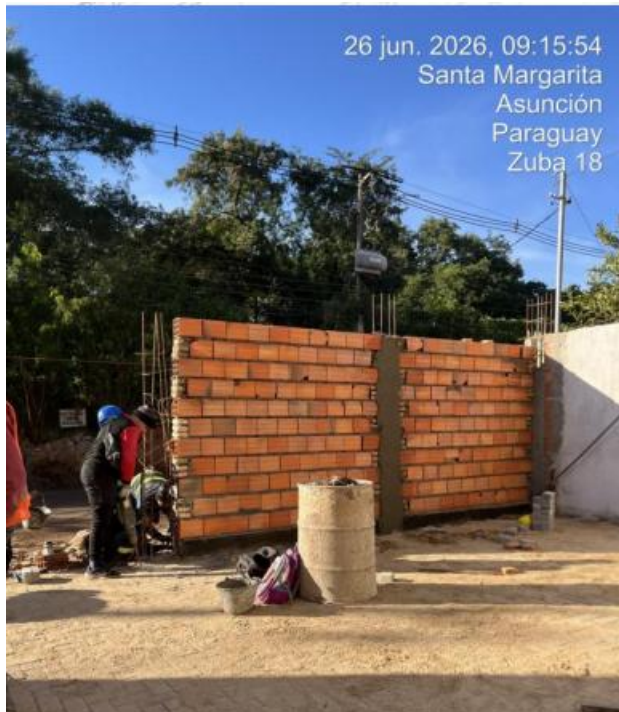

Maposteria en Fachada- Colocacion de cartelera

**¡MUCHAS  
GRACIAS!**

