



ZUBA

19

ABRIL 2026

ABRIL 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

- **Albañilería:** Elevación de mamposterías en azotea y revoques hasta Azotea. Revoque exterior fachada interna
- **Contrapiso y carpeta:** avances hasta Azotea
- **Instalaciones Eléctricas:** lanzamiento de alimentadores en piso 1. Artefactos de iluminación en pasillos piso 1
- **Instalaciones sanitarias:** agua corriente en Azotea. Desagüe cloacal y pluvial en PB. PCI avance PB
- **Climatización:** montaje de evaporadores hasta piso 2
- **Cielorraso:** avances hasta el piso 6, inicio de cielorraso en pasillos en piso 1
- **Aislaciones:** baños, laundry y tanque elevado completados
- **Pintura:** enduido hasta piso 6
- **Colocación de pisos y revestidos:** avances en piso 7, revestimientos de baños en piso 5
- **Señales débiles:** colocación de artefactos HC y TV en piso 1 y 2
- **Estructura metálica:** Montaje de barandas en balcón francés en fachada principal
- **Muebles de Cocina:** avances en piso 1 y 2
- **Mármol y granito:** mármol en baños hasta piso 5, granitos en cocina piso 1
- **Carpintería de madera:** puertas principales hasta piso 3

Avance General

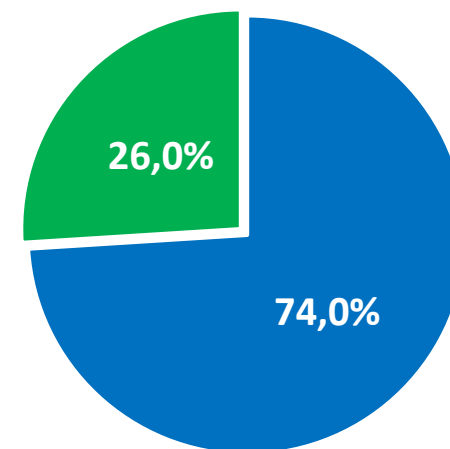

■ Avance de obra actual

■ Avance restante



AVANCE DE OBRA



Lijado y sellado de paredes – Colocación de mesadas en baños – Revoque en fachada



AVANCE DE OBRA



298° NW
585 General Abdón Caballero
Luque
Central
20 abr. 2026 16:10:03
S25° 17,286, W57° 32,307
Altitud:112.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Zuba 19



162° S
Ybyturusu
Luque
Central
29 abr. 2026 12:50:28
S25° 17,261, W57° 32,341
Altitud:117.1msnm
Zuba 19



194° S
585 General Abdón Caballero
Luque
Central
18 abr. 2026 10:45:30
S25° 17,268, W57° 32,295
Altitud:125.8msnm
Velocidad:0.0km/h
Zuba 19

Colocación de puertas en departamentos - lijado y sellado en palieres - colocación de pisos y zócalos



**¡MUCHAS
GRACIAS!**
