



ZUBA 19

AGOSTO 2026

AGOSTO 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General

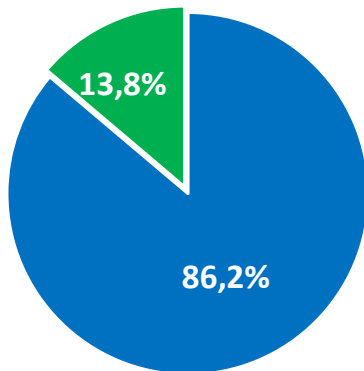

■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- Albañilería (99,17%): Ladrillos vistos con avance a la fecha de 95,00%; así mismo en revoque interior en paredes hemos alcanzado el 98.50%. Revoque exterior hemos alcanzado un 97.45%
- Instalaciones Eléctricas (83,78%): avances en lobby (Puesto de distribución) y azotea. Colocación de mecanismos y lanzamiento de cables de alimentadores desde nivel 8.
- Instalaciones Sanitarias (84,96%): Colocación de griferías en baños y cocinas piso 3 y piso 4, con un avance del 100% y 60% respectivamente. Artefactos sanitarios (inodoros) colocados hasta el piso 6 con un avance de 95%. Colocación de los accesorios de baños (toallero, jabonera, etc.) piso 1 y 2 con avance del 100% en ambos pisos.
- Impermeabilización (93,54%): balcones tipo francés, balcones técnicos y mocheta en aberturas.
- Pintura (52,61%): Enduido y sellado en cielorrasos hasta el piso 7 con un avance del 78%. Enduido cementicio (losa vista en sala, dormitorios y losa técnica) primera mano hasta piso 7 y segunda mano hasta piso 5 con avance del 100%
- Carpintería de Aluminio (77,31%): Registramos un 77,31% del total de aberturas de vidrios(ventanas y puerta 80% respectivamente).
- Muebles y equip. Interior (87,5%): Continuamos el montaje de los muebles de cocina con un avance del 87,50% que llega hasta el piso 7.
- Mármol y granito (65%): Acompañamos el montaje de los muebles de cocina con la colocación de mesadas de granito en las mismas, con un avance del 65 % que llega hasta el piso 6.
- Carpintería de madera (61,57%): Puertas principales en departamentos con 69,33% de avance, puertas de dormitorios 69,66% y puertas de baños con 68,42%.



AVANCE DE OBRA



Trabajo de ladrillo visto – Instalación de piso paver – Trabajos de instalaciones hidrosanitarias



AVANCE DE OBRA



Revoque en caja de Escalera – Instalación de piso paver – Instalación de ladrillo visto en fachada



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

