



ZUBA
Z19
FEBRERO 2026

FEBRERO 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

- **Albañilería:** Elevación de mamposterías en azotea y revoques hasta Azotea. Revoque exterior fachada Principal
- **Contrapiso y carpeta:** avances hasta piso 7
- **Instalaciones Eléctricas:** Montaje de llaves TM en tableros piso 1 al 4 cableado en piso 6. Corrugados y cajas hasta Azotea
- **Instalaciones sanitarias:** agua corriente en Azotea. Desagüe ci y pl en Azotea. PCI avance hasta Azotea
- **Climatización:** cañerías de cobre y desagüe concluido hasta el nivel 7
- **Cielorraso:** avances hasta el piso 5
- **Aislaciones:** de baños hasta el piso 7. Aislación de tanque
- **Pintura:** enduido hasta piso 5
- **Colocación de pisos y revest:** avances en piso 4
- **Señales débiles:** avances hasta piso 6
- **Estructura metálica:** Montaje de techo

Avance General

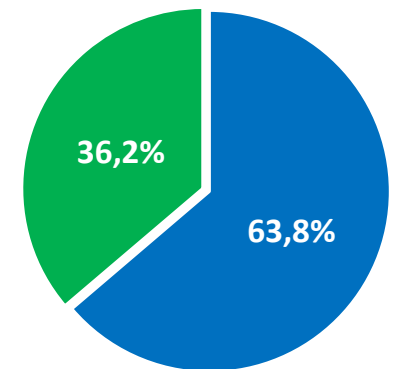


■ Avance de obra actual

■ Avance restante




AVANCE DE OBRA

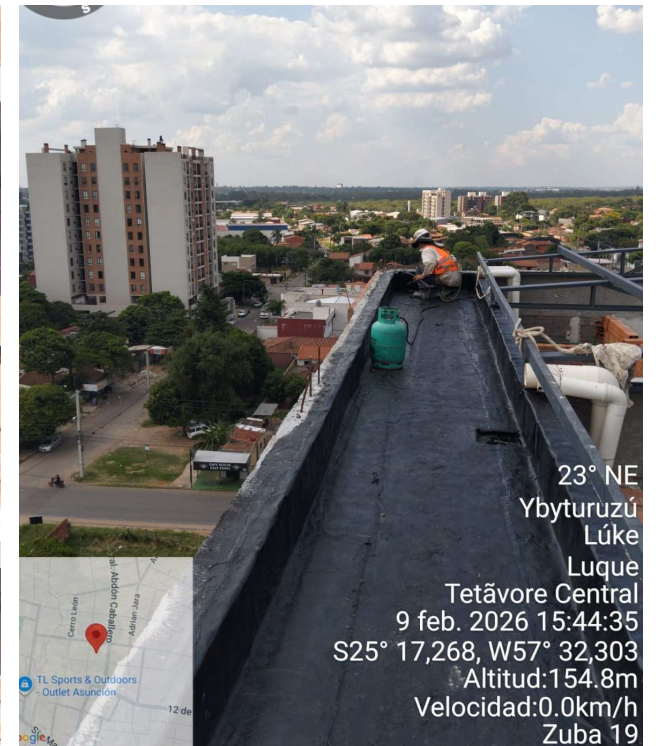

Elevación de mampostería – Instalación de membrana



AVANCE DE OBRA

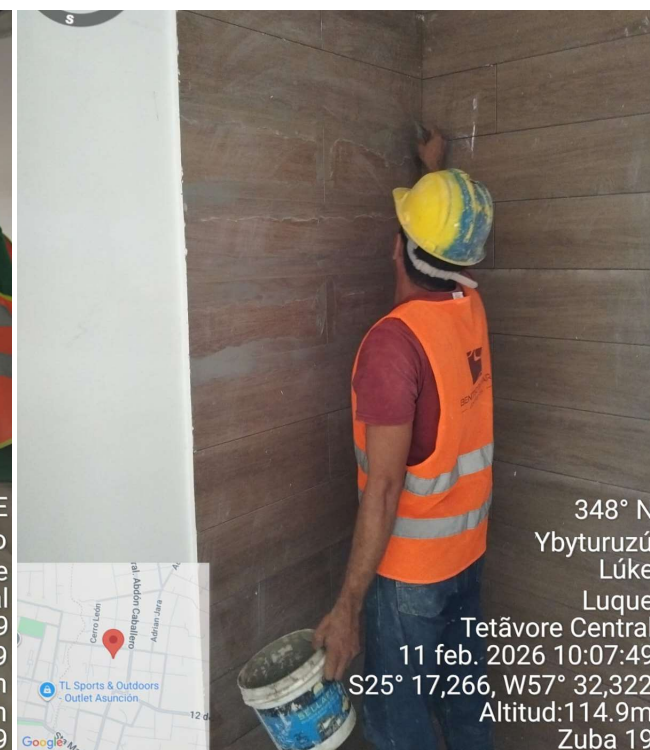

Instalación de pisos en pasillos – Instalación de cielorraso – Instalación de revestimiento en baños



**¡MUCHAS
GRACIAS!**
