



ZUBA 19

JUNIO 2026

JUNIO 2026

ZUBA

19



TRABAJOS REALIZADOS




AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

Avance General

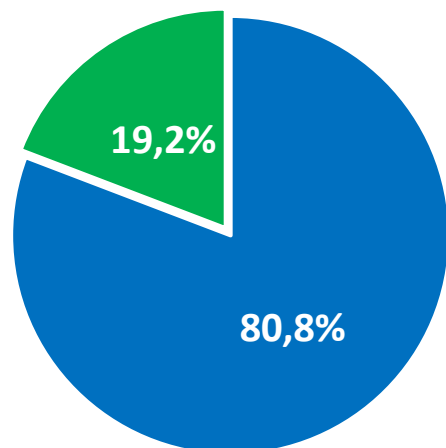


■ Avance de obra actual

■ Avance restante

- Albañilería (98,35%): elevación de mamposterías en azotea para cierres de techo y revoque exterior en fachada posterior.
- Contrapiso y carpeta (100%): avances en planta baja y azotea.
- Instalaciones Eléctricas (69,54%): avances en lobby (puesto de distribución) y azotea; colocación de mecanismos.
- Instalaciones Sanitarias (83,17%): montaje de accesorios en baños y tanque elevado.
- Climatización (83%): montaje de evaporadores hasta piso 5.
- Cielorraso (86,28%): terminaciones en piso 1 y baños hasta piso 6.
- Aislaciones (87%): balcones tipo francés y balcones técnicos.
- Pintura (49,77%): 2da mano en pisos 1 y 2, enduido en baños, lijado y sellado en piso 6.
- Colocación de pisos y revest. (76,55%): terminaciones en pisos 1 y 2, pastina en piso 5.
- Señales débiles (60%): avances en lobby y piso 1.
- Estructura metálica techo (100%): montaje de soportes para AA, barandas en dptos y losas técnicas.
- Muebles de Cocina (60%): montaje hasta piso 5.
- Mármol y granito (41,31%): mesadas de granito hasta piso 3.
- Carpintería de madera (52,92%): colocación de puertas hasta piso 5.



AVANCE DE OBRA

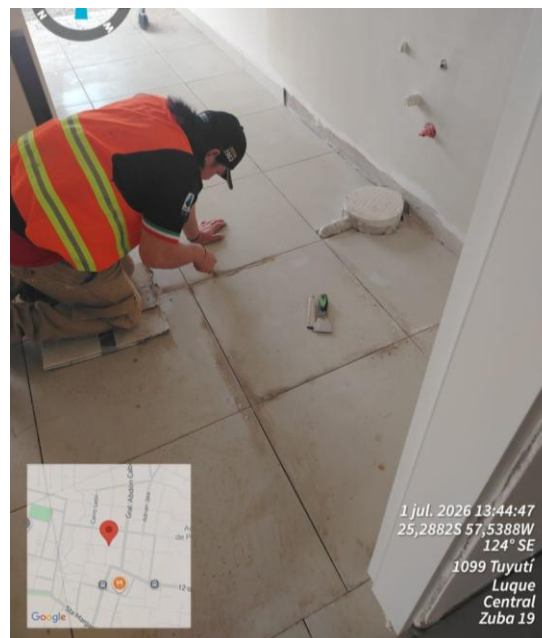

Montaje de muebles de cocina – Colocación de pisos y revestimientos – Climatización (evaporadores)



AVANCE DE OBRA



Enduido y pintura – Mesadas de granito – Avance de fachada exterior

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

