



**ZUBA**  
**19**  
MARZO 2026

MARZO 2026

**ZUBA**

**19**



**TRABAJOS REALIZADOS**




**AVANCE DE OBRA**




## TRABAJOS REALIZADOS

- **Albañilería:** Elevación de mamposterías en azotea y revoques hasta Azotea. Revoque exterior fachada interna
- **Contrapiso y carpeta:** avances hasta Azotea
- **Instalaciones Eléctricas:** Montaje de llaves TM en tableros piso 1 al 4 cableado en piso 6. Corrugados y cajas hasta Azotea
- **Instalaciones sanitarias:** agua corriente en Azotea. Desagüe cl y pl en PB. PCI avance PB
- **Climatización:** cañerías de cobre y desagüe concluido hasta el nivel 7
- **Cielorraso:** avances hasta el piso 5
- **Aislaciones:** de baños hasta el piso 7. Aislación de tanque
- **Pintura:** enduido hasta piso 5
- **Colocación de pisos y revest:** avances en piso 6
- **Señales débiles:** avances hasta piso 6
- **Estructura metálica:** Montaje de techo culminado

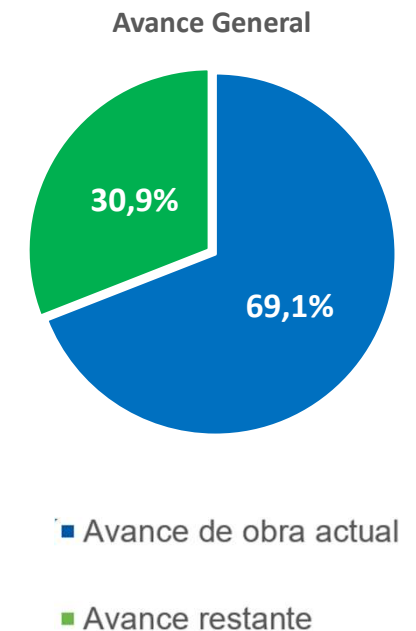




## AVANCE DE OBRA

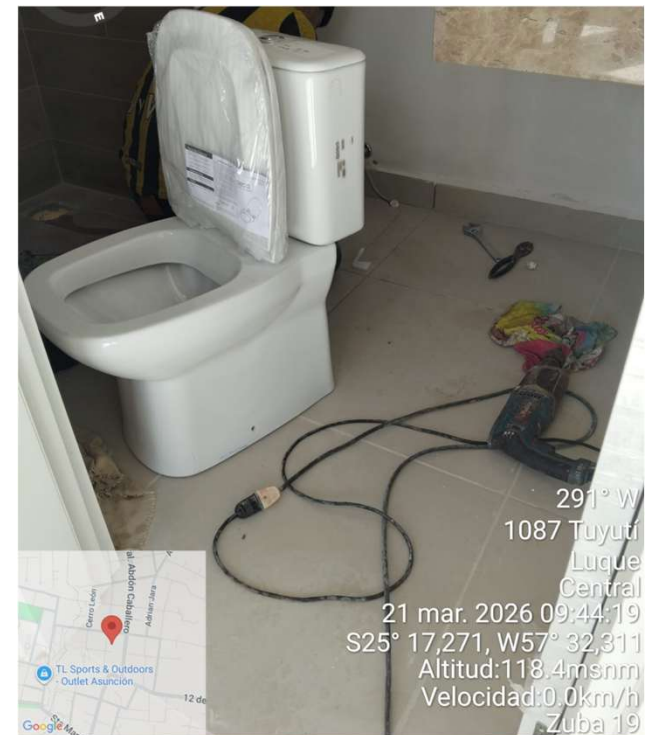

Trabajos en tableros – Revestimiento en ducheros – Instalación de artefactos sanitarios



## AVANCE DE OBRA

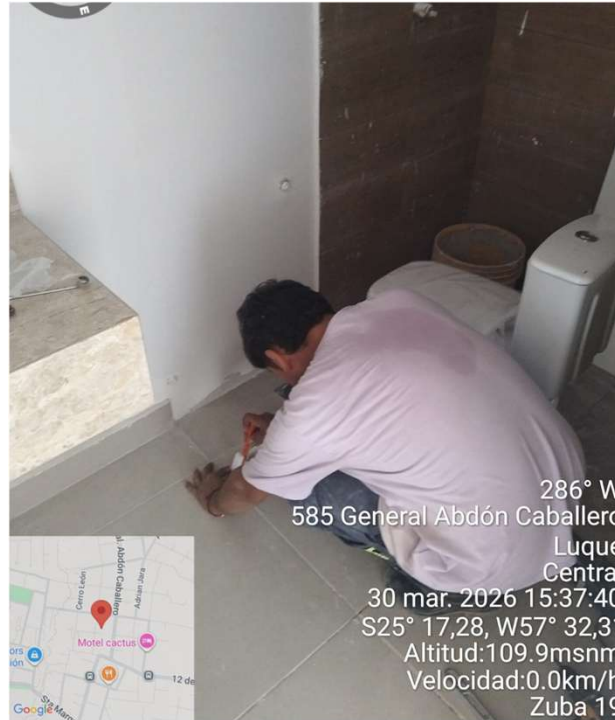

Colocación de pisos en pasillos y Colocación de pastina en junta de pisos



**¡MUCHAS  
GRACIAS!**
