



ZUBA 23

SEPTIEMBRE 2026

SEPTIEMBRE 2026

ZUBA

23



TRABAJOS REALIZADOS



AVANCE DE OBRA



TRABAJOS REALIZADOS

- Avances en trabajos:

Trabajos preliminares: 100 %


Fundaciones: 29,85 %

Avance por rubro

Trabajos preliminares 100 %



Fundaciones 29,85 %





TRABAJOS REALIZADOS

TRABAJOS REALIZADOS:

- Instalación de tanques de polímero y generador para evitar el desmoronamiento del terreno durante el pilotaje
- Demolición de muros linderos (sector Petropar y predio vecino) e instalación de vallado
- Instalación de postes de iluminación y contenedor para oficina técnica y deposito de materiales.
- Instalación de poste eléctrico y conexión trifásica en obra
- Ejecución de pilotes (cargamento de hormigón) a lo largo del mes



AVANCE DE OBRA



Intento de pilotaje e instalación de tanques de polímero y generador. Demolición de muro lindero e instalación de vallado.




AVANCE DE OBRA



Cargamento de pilotes 12-2 (con polímero), 12-4 y 12-6. Instalación de postes de iluminación y techo metálico.




AVANCE DE OBRA

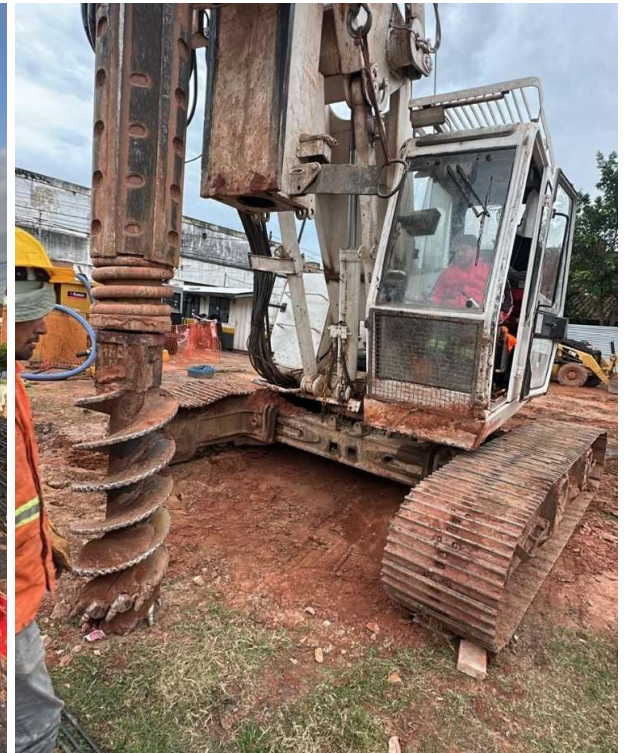

Instalación de poste eléctrico trifásico. Cargamento de pilotes 50.11, 12.01, 12.3 y 50.10.





AVANCE DE OBRA

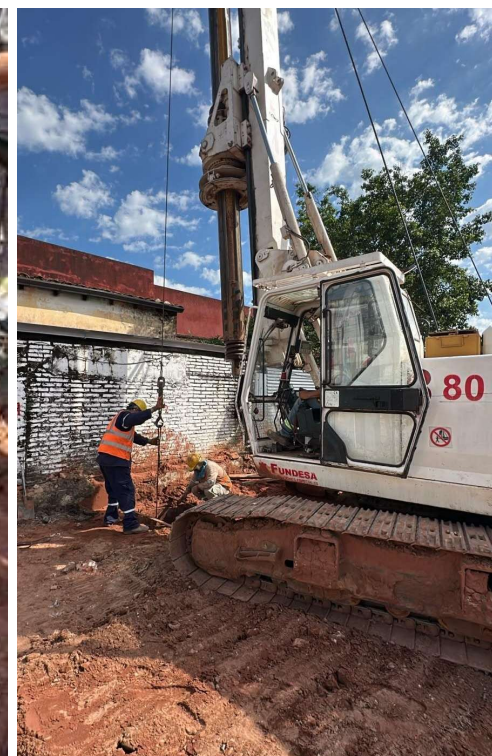

Cargamento de pilotes 80.6, 80.3, 12.5 y 80.5. Conexión trifásica en obra.




AVANCE DE OBRA

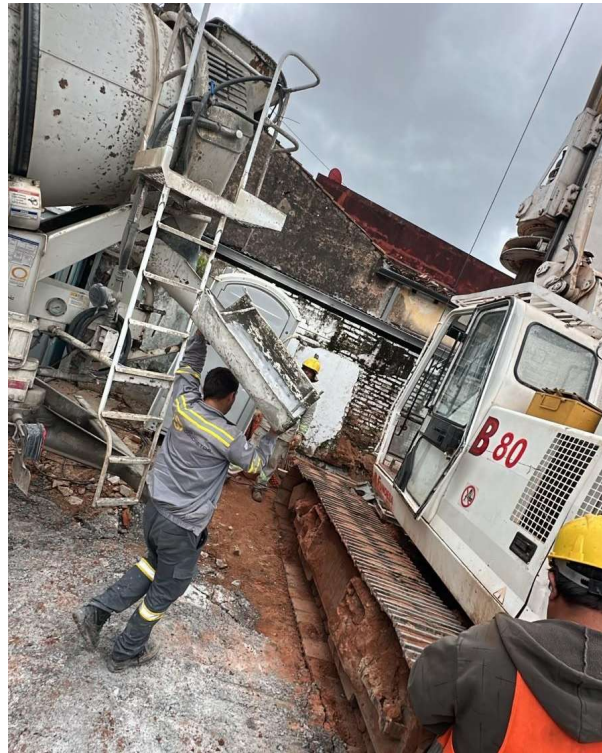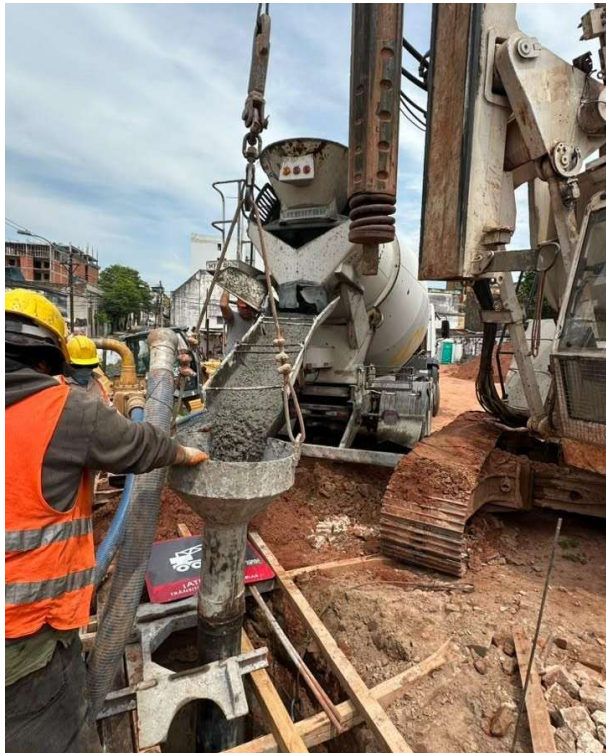

Cargamento de pilotes 12.12, 80.2, 12.11 y 80.8.




AVANCE DE OBRA

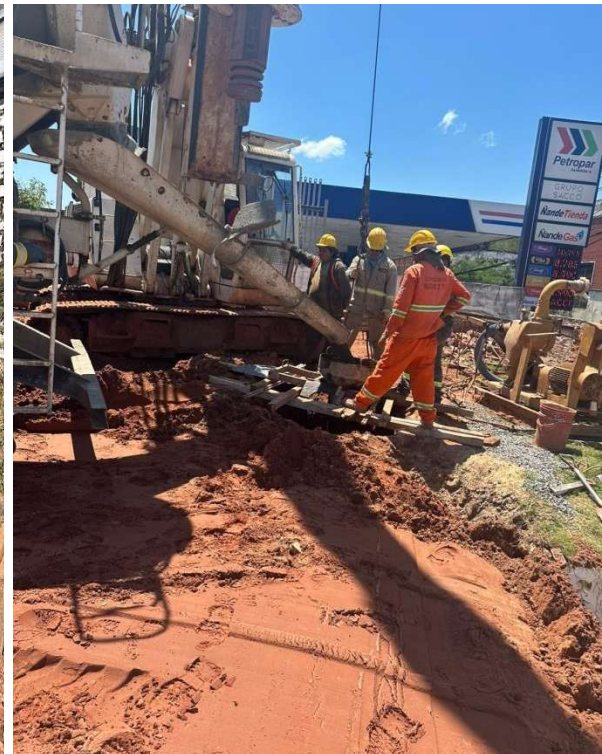

Cargamento de pilotes 80.1, 12.9 y 12.10.



AVANCE DE OBRA

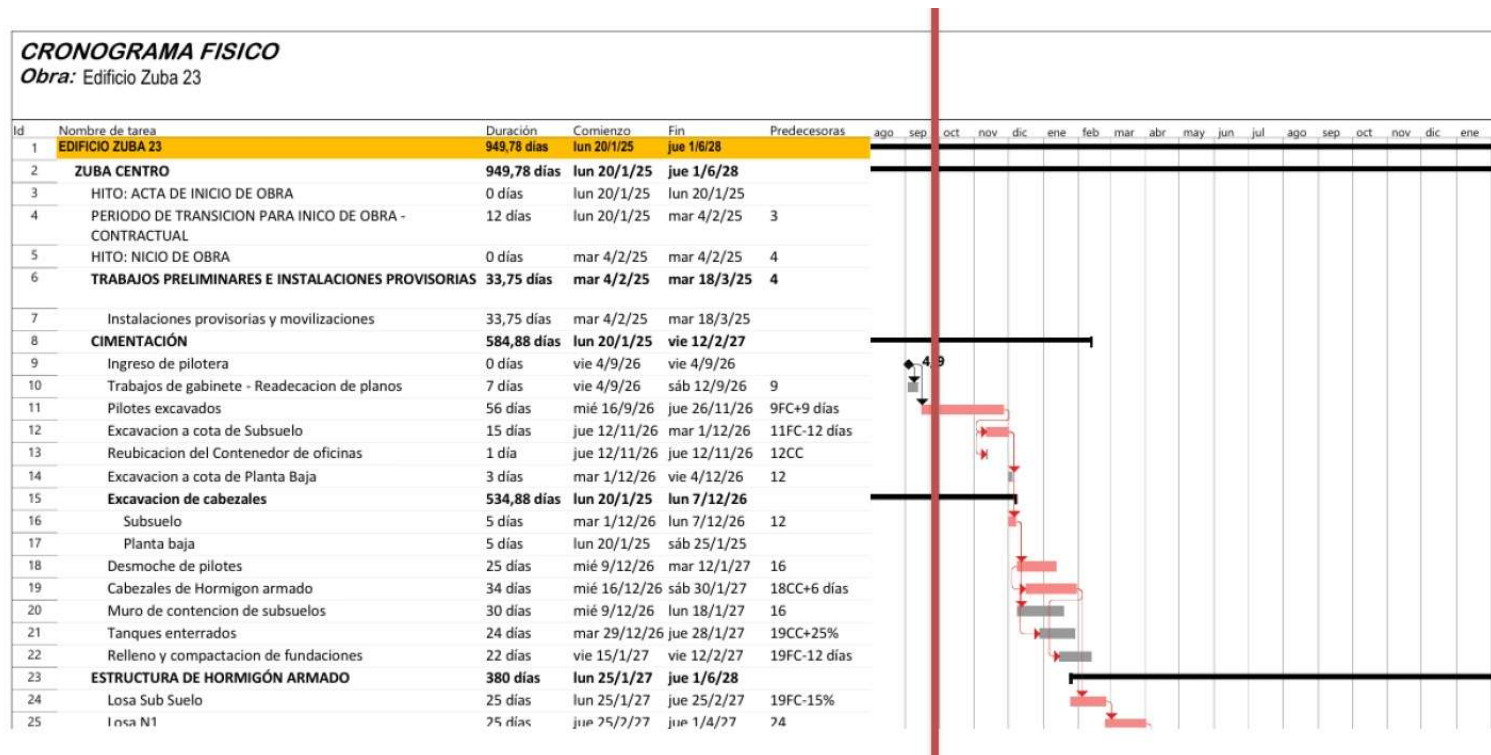

Cronograma de obra: la línea roja marca donde estamos actualmente.

An aerial photograph of a cityscape, featuring a prominent modern high-rise building with a glass facade and balconies. The building is situated near a large body of water, likely a river or lake, which stretches across the background. The surrounding area includes various other buildings, some with flat roofs, and green spaces. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text "¡MUCHAS GRACIAS!" is centered in the middle of the image in a bold, white, sans-serif font.

**¡MUCHAS
GRACIAS!**
